Job Name: 25-1684P14 KYTC Jefferson Co. Call 200 (251007) Job Location: I-264 Louisville, Ky. Contractor: Cleary Construction, Inc.	Plant: Beaver Dam, KY 8/4/2026 11:28:40 AM	Tech: J. Coppage PC: T. Ryan	

Structure ID: 5074+83 LT CBBI-MOD B1

P2 CMBBIT9-B1LH CB MED BAR BOX INLET 9B1 LH

P3) 24" x 120" - CASTING (cast in) - 3"	0 lb
P2) 24" x 120" - CB MED BAR BOX INLET 9B1 LH - 17"	4000 lb
P1) 24" x 36" - BOX BASE 8inW, 8inF, Variable Ht - 33"	4241 lb
1) 24" x 36" - Conseal CS-102 1.00"	0 lb
1) Hole - 22	0 lb
1) Hole - 26	0 lb

Structure Total:	8241 lb

Structure Notes: .
- -KYTC STATE PROJECT 251007
- -REINFORCING: #5 BAR @ 12" C/C E.W. (TYP.)
- -CASTING FRAMES & GRATES BY OTHERS.
- -CS-102 BUTYL REQUIRED (SUPPLIED BY ICAST).
- -KYTC CERTIFICATIONS REQUIRED.

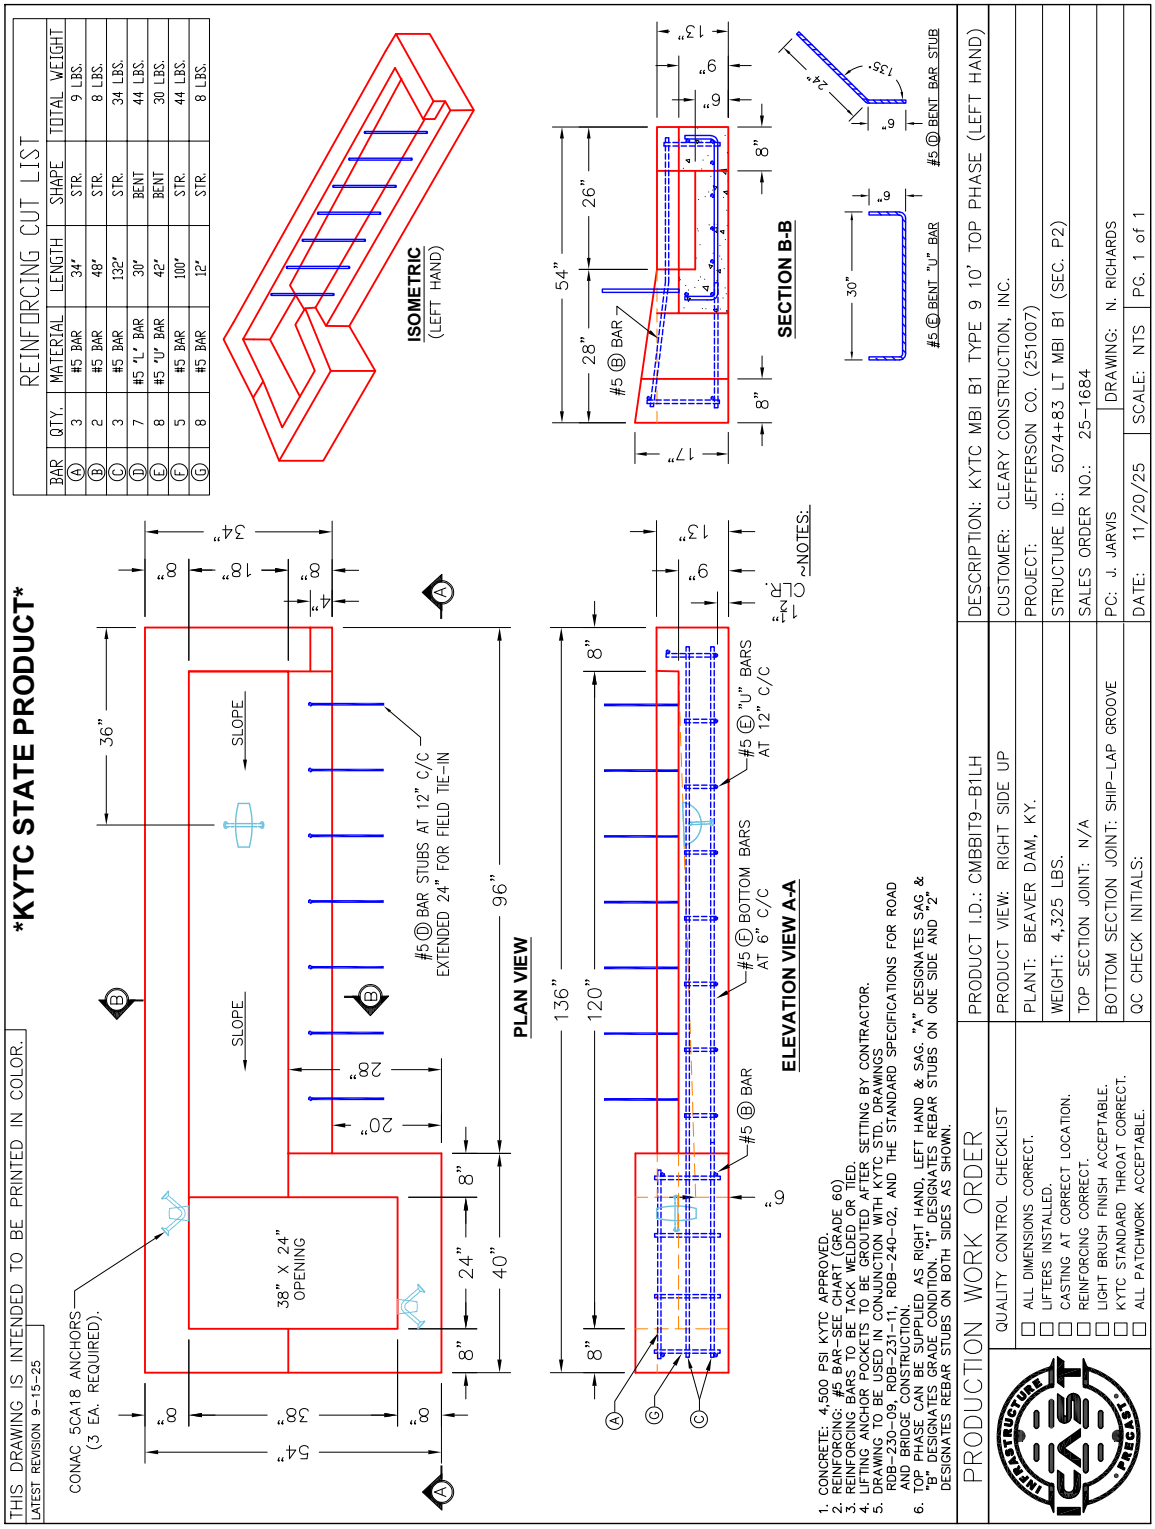

Coating (Int): Coating (Ext):	Seam Up: Flat Seam Dn: Flat	Wall Thickness: 8"	Height (Ext): 17"	Weight (Net): 4000 lb Volume (Net): 0cu.yd
